



171012050428

常州市丰盈金属制品有限公司年产 4000 吨锌合金压铸（汽
车零配件）、铝合金压铸（电器零配件）项目
竣工环境保护验收监测报告表

建设单位： 常州市丰盈金属制品有限公司

编制单位： 江苏泰洁检测技术股份有限公司常州分公司

2021 年 08 月



检验检测机构 资质认定证书

证书编号：171012050428

名称：江苏泰洁检测技术股份有限公司常州分公司

地址：武进国家高新技术产业开发区人民东路158号2号楼5层北
车间（213616）

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任，由江苏泰洁检测技术股份有限公司承担。

许可使用标志



171012050428

发证日期：2018年5月25日更名

有效期至：2023年8月28日

发证机关：



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

0000819

建设单位：常州市丰盈金属制品有限公司（盖章）

建设单位法定代表人：徐纪文

联系人：徐纪文

联系方式：13775293882

邮编：213176

地址：常州市武进区礼嘉镇建东村建东路 10 号

编制单位：江苏泰洁检测技术股份有限公司常州分公司（盖章）

编制单位法定代表人：丁燕

项目负责人：朱胜伟

电话：0519-81699918

邮编：213100

地址：武进国家高新技术产业开发区人民东路 158 号 2 号楼 5 层北车间

目录

表一、验收项目概况以及验收依据.....	1
表二、工程建设情况.....	5
表三、环境保护设施.....	12
表四、环评主要结论及审批部门审批决定.....	17
表五、质量保证及质量控制.....	20
表六、验收监测内容.....	23
表七、验收监测结果.....	24
表八、验收监测结论.....	32
注释.....	35
建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表.....	36

表一、验收项目概况以及验收依据

建设项目名称	年产 4000 吨锌合金压铸（汽车零部件）、铝合金压铸（电器零配件）项目				
建设单位名称	常州市丰盈金属制品有限公司				
建设项目性质	新建√ 改扩建 技改 迁建 其他				
主要产品名称	锌合金压铸（汽车零部件）、铝合金压铸（电器零配件）				
设计生产能力	年产 500 吨锌合金压铸（汽车零部件）、3500 吨铝合金压铸（电器零配件）				
实际生产能力	年产 500 吨锌合金压铸（汽车零部件）、3500 吨铝合金压铸（电器零配件）				
建设项目环评 批复时间	2021 年 04 月 19 日	开工建设时间	2021 年 04 月		
调试时间	2021 年 07 月	验收现场 监测时间	2021 年 07 月 29-30 日		
环评报告表 审批部门	常州市生态环境局	环评报告表 编制单位	常州嘉骏环保服务有限公司		
环保设施 设计单位	常州市胜源环保设 备厂	环保设施 施工单位	常州市胜源环保设备厂		
投资总概算	1000 万元	环保投资总概算	33 万元	比例	3.3%
实际总投资	1000 万元	环保投资	33 万元	比例	3.3%
验收 监 测 依 据	<p>1、《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号）；</p> <p>2、《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国令第 682 号）；</p> <p>3、《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办[2021]122 号）；</p> <p>4、关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688 号）；</p> <p>5、《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环办环评函[2017]1235 号）；</p> <p>6、《关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告》（国环规环评[2017]4 号）；</p> <p>7、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告，2018 年第 9 号）；</p>				

- 8、《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（苏环办[2018]34号）；
- 9、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）；
- 10、《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（省政府[1993]第38号令）；
- 11、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）；
- 12、《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）；
- 13、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）；
- 14、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；
- 15、《声环境质量标准》（GB 3096-2008）；
- 16、常州市丰盈金属制品有限公司《年产4000吨锌合金压铸（汽车零配件）、铝合金压铸（电器零配件）项目环境影响报告表》（常州嘉骏环保服务有限公司，2021年01月）；
- 17、常州市丰盈金属制品有限公司《年产4000吨锌合金压铸（汽车零配件）、铝合金压铸（电器零配件）项目环境影响报告表》批复（常州市生态环境局，常武环审[2021]194号，2021年04月19日）；
- 18、常州市丰盈金属制品有限公司“年产4000吨锌合金压铸（汽车零配件）、铝合金压铸（电器零配件）项目”竣工环境保护验收监测方案（江苏泰洁检测技术股份有限公司常州分公司，2021年07月）。

验收监测评价标准

1、废水排放标准

本验收项目废水主要为生活污水，经市政污水管网接入武南污水处理厂进行处理。废水接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 B 级标准，具体标准见表 1-1。

表 1-1 水污染物排放标准

采样点位	污染物	单位	验收标准限值	验收标准依据
污水接管口	化学需氧量	mg/L	500	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准
	悬浮物	mg/L	400	
	氨氮	mg/L	45	
	总磷	mg/L	8	
	总氮	mg/L	70	
	pH 值	无量纲	6.5~9.5	

2、废气排放标准

本验收项目废气主要为颗粒物和甲烷总烃，其中熔化烟尘（主要污染因子为颗粒物）排放标准执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表 1 及表 3 中标准要求；压铸废气（主要污染因子为甲烷总烃）排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 2 中标准要求；抛丸粉尘（主要污染因子为颗粒物）无组织排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 3 中的标准要求，具体标准见表 1-2。

表 1-2 大气污染物排放标准

污染物名称	最高允许排放浓度, mg/m ³	最高允许排放速率, kg/h		无组织排放监控浓度限值		执行标准
		排气筒, m	二级	监控点	浓度, mg/m ³	
颗粒物（熔化烟尘）	20	15	/	在工业炉窑所在厂房生产车间门、窗等排放口的浓度最高点	5.0	《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表 1 及表 3 中的标准要求
颗粒物（抛丸粉尘）	/	/	/	周界外浓度最高值	0.5	
非甲烷总烃	60	15	3		厂房门窗或通风口外 1m 处	4
非甲烷总烃	/	/	/	6（1h 平均值） 20（任意一次值）		

3、噪声排放标准

本验收项目运行期间，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准；敏感点何四房、沈庄桥噪声执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中2类标准，具体标准见表1-3。

表 1-3 噪声排放标准

类别	时段	验收标准限值 dB(A)	执行区域	验收标准依据
厂界	昼间	≤60	东、南、西、北 厂界	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)表1中2类标准
区域环境 噪声	昼间	≤60	何四房、沈庄桥	《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 表1中2类标准
备注	本项目夜间不生产			

4、固体废物执行标准

本项目一般固废贮存及管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求，危险废物贮存及管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。

5、总量控制指标

本验收项目总量控制指标见表1-4。

表 1-4 污染物总量控制一览表

污染物类别	污染物总量控制指标 t/a		依据
	污染物名称	排放量	
生活污水	污水量	449	环评及批复
	化学需氧量	0.18	
	悬浮物	0.13	
	氨氮	0.016	
	总磷	0.0022	
	总氮	0.022	
有组织废气	非甲烷总烃	0.18	环评及批复
	颗粒物	0.243	
固体废物	全部综合利用或安全处置		
备注	/		

表二、工程建设情况

1、项目由来

常州市丰盈金属制品有限公司成立于 2009 年 07 月 28 日，位于常州市武进区礼嘉镇建东村建东路 10 号。企业经营范围：锌合金、铝合金铸造，电子元器件制造、加工，冲压件加工。

常州市丰盈金属制品有限公司原位于常州市武进区礼嘉镇礼嘉村，于 2018 年 09 月委托常州嘉骏环保服务有限公司编制《年产 4000 吨锌合金压铸（汽车零配件）、铝合金压铸（电器零配件）项目环境影响报告表》，并于 2018 年 11 月进行申报，但由于当时铸造产能限批，该项目一直处于搁置状态，原址内已停止生产。

根据《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关文件要求，常州市丰盈金属制品有限公司于 2020 年 09 月 28 日取得排污许可证（编号：9132041269258099X5001U）。

为完善环保手续，常州市丰盈金属制品有限公司于 2021 年 01 月委托常州嘉骏环保服务有限公司编制《年产 4000 吨锌合金压铸（汽车零配件）、铝合金压铸（电器零配件）项目环境影响报告表》，并于 2021 年 04 月 19 日取得常州市生态环境局的批复（常武环审[2021]194 号）。

目前，该项目主体工程及配套的三同时环保设施已完成建设并运行稳定，具备了竣工环境保护验收监测条件，因此企业启动自主环保验收工作，本次验收内容为常州市丰盈金属制品有限公司“年产 4000 吨锌合金压铸（汽车零配件）、铝合金压铸（电器零配件）项目”的整体验收，即生产能力为年产 500 吨锌合金压铸（汽车零配件）、3500 吨铝合金压铸（电器零配件）。

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等文件的要求，受常州市丰盈金属制品有限公司委托，江苏泰洁检测技术股份有限公司常州分公司承担该项目的竣工环境保护验收监测工作。

2021 年 07 月 29-30 日，江苏泰洁检测技术股份有限公司常州分公司对该项目进行了现场验收监测。经对验收监测结果统计分析，结合现场环保管理检查，在资料调研及环保管理检查的基础上，编制了常州市丰盈金属制品有限公司《年产 4000 吨锌合金压铸（汽车零配件）、铝合金压铸（电器零配件）项目竣工环境保护验收监测报告表》。

项目基本信息及建设时间进度见表 2-1。

表 2-1 项目基本信息及建设时间进度一览表

内容	基本信息及时间进度
项目名称	年产 4000 吨锌合金压铸（汽车零配件）、铝合金压铸（电器零配件）项目
建设单位	常州市丰盈金属制品有限公司
法人代表	徐纪文
联系人/联系方式	徐纪文/13775293882
行业类别及代码	C3392 有色金属铸造
建设性质	新建
建设地点	常州市武进区礼嘉镇建东村建东路 10 号
	经度：E120°02'32.81"，纬度：N31°38'30.71"
立项备案	常州市武进区行政审批局，武行审备[2018]381 号，2018-320412-32-03-543786
环评文件	常州嘉骏环保服务有限公司，2021 年 01 月
环评批复	常州市生态环境局，常武环审[2021]194 号，2021 年 04 月 19 日
开工建设时间	2021 年 04 月
竣工时间	2021 年 07 月
调试时间	2021 年 07 月
申请排污许可证情况	企业已于 2020 年 09 月 28 日取得排污许可证(编号:9132041269258099X5001U)
验收工作启动时间	2021 年 07 月
验收项目范围与内容	本次验收内容为常州市丰盈金属制品有限公司“年产 4000 吨锌合金压铸（汽车零配件）、铝合金压铸（电器零配件）项目”的整体验收，即生产能力为年产 500 吨锌合金压铸（汽车零配件）、3500 吨铝合金压铸（电器零配件）
验收监测方案编制时间	2021 年 07 月
验收现场监测时间	2021 年 07 月 29-30 日
验收监测报告	江苏泰洁检测技术股份有限公司常州分公司，2021 年 08 月

2、工程建设内容

本项目产品方案见表 2-2。

表 2-2 项目产品方案

序号	产品名称	设计生产能力	实际生产能力	年运营时数
1	锌合金压铸（汽车零配件）	500 吨/年	500 吨/年	3960h
2	铝合金压铸（电器零配件）	3500 吨/年	3500 吨/年	3960h

本项目建设内容与环评审批对照详见表 2-3。

表 2-3 建设项目环境保护验收/变更内容一览表

类别	主要内容	环评审批项目内容	实际建设/变更情况	
项目基本情况	建设地点	常州市武进区礼嘉镇建东村建东路 10 号	与环评一致	
	建设内容及规模	本项目建筑面积 2500m ² ，项目建成后形成年产 4000 吨锌合金压铸（汽车零配件）、铝合金压铸（电器零配件）的生产规模，具体为年产 500 吨锌合金压铸（汽车零配件）、3500 吨铝合金压铸（电器零配件）	与环评一致	
	工作制度	员工 20 人，每天一班制 12h 工作，年工作 330 天	与环评一致	
主体工程	车间一	建筑面积 600m ² ，1F，位于厂区西北侧，主要有熔化、压铸、钻孔工序	与环评一致	
	车间二	建筑面积 400m ² ，1F，位于车间一东侧，主要有抛丸工序	与环评一致	
	办公楼	建筑面积 1008m ² ，3F，位于车间二南侧，其中一楼作仓库用，二楼用于办公、管理，三楼闲置	与环评一致	
	辅房	建筑面积 492m ² ，1F，位于办公楼南侧	与环评一致	
贮运工程	原料区	100m ² ，位于办公楼一楼，用于储存原辅料	与环评一致	
	成品区	200m ² ，位于办公楼一楼，用于储存成品	与环评一致	
公用工程	给水系统	由市政给水管网统一供给	与环评一致	
	排水系统	本项目厂区内部已落实“雨污分流”，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网，生活污水经市政污水管网接入武南污水处理厂进行处理，处理后尾水达标排入武南河	与环评一致	
	供电系统	由市政电网统一供给	与环评一致	
环保工程	废气处理	熔化烟尘、压铸废气经耐高温过滤网+水喷淋+光解催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过一根 15 米高排气筒（1#）排放	与环评一致	
		抛丸粉尘经抛丸机自带的脉冲袋式除尘装置处理后在车间内无组织排放	与环评一致	
	噪声防治	合理布局、厂房隔声、设备减振，达标排放	与环评一致	
	固体废物	生活垃圾	垃圾桶统一收集，环卫部门集中处理	与环评一致
		一般固废堆场	50m ² ，位于车间一西侧	与环评一致
	危废库	30m ² ，位于车间二北侧	与环评一致	

3、主要生产设备情况

本验收项目主要生产设备见表 2-4。

表 2-4 生产设备一览表


类别	设备名称	规格型号	所用工序	数量（台/套）		变更情况
				环评	实际	
锌合金压铸生产线	感应电炉	200kg	熔化	1	1	与环评一致
		300kg		1	1	与环评一致
	热室压铸机	88T	压铸	1	1	与环评一致
		150T		1	1	与环评一致
铝合金压铸生产线	感应电炉	200kg	熔化	3	3	与环评一致
		300kg		2	2	与环评一致
	冷室压铸机	200T	压铸	1	1	与环评一致
		300T		2	2	与环评一致
		630T		1	1	与环评一致
		800T		1	1	与环评一致
共用设备	抛丸机	Q32	抛丸	2	2	与环评一致
	钻床	/	钻孔	6	6	与环评一致
	烘箱	/	烘干	1	1	与环评一致
公辅工程	空压机	1m ³	提供动力	2	2	与环评一致
	循环冷却水塔	5T	供应压铸机所需的冷却水	2	2	与环评一致

4、原辅材料消耗及水平衡

本验收项目主要原辅材料消耗见表 2-5，实际水平衡图见图 2-1。

表 2-5 主要原辅材料消耗表

名称	重要组分、规格	单位	年耗量	
			环评	实际
铝合金锭	Al 87~88%、Si 10~13%、Fe≤0.7%、Cu≤0.30%、Mg 0.2~0.3%、Mn 0.3~0.5%、Zn≤0.10%，不含五大类重金属（铅、汞、铬、镉和类金属砷）	吨	3543.5	3543.5
锌合金锭	Zn 85~86%、Si 11~14%、Fe≤0.7%、Cu≤0.30%、Mg 0.2~0.3%、Mn 0.3~0.5%、Al≤0.10%，不含五大类重金属（铅、汞、铬、镉和类金属砷）	吨	511.2	511.2
脱模剂	20L/桶，硬脂酸 10%、甲基硅油 15%、烷基酚聚氧乙烯醚 3%、脂肪醇聚氧乙烯醚 2%、甲基纤维素 5%、水 65%，不含 N、P	吨	10	10
除渣剂	20kg/箱，SiO ₂ 68%、Al ₂ O ₃ 12.9%、MgO 19.1%	吨	6.4	6.4
润滑油	200L/桶，基础矿物油	吨	0.8	0.8

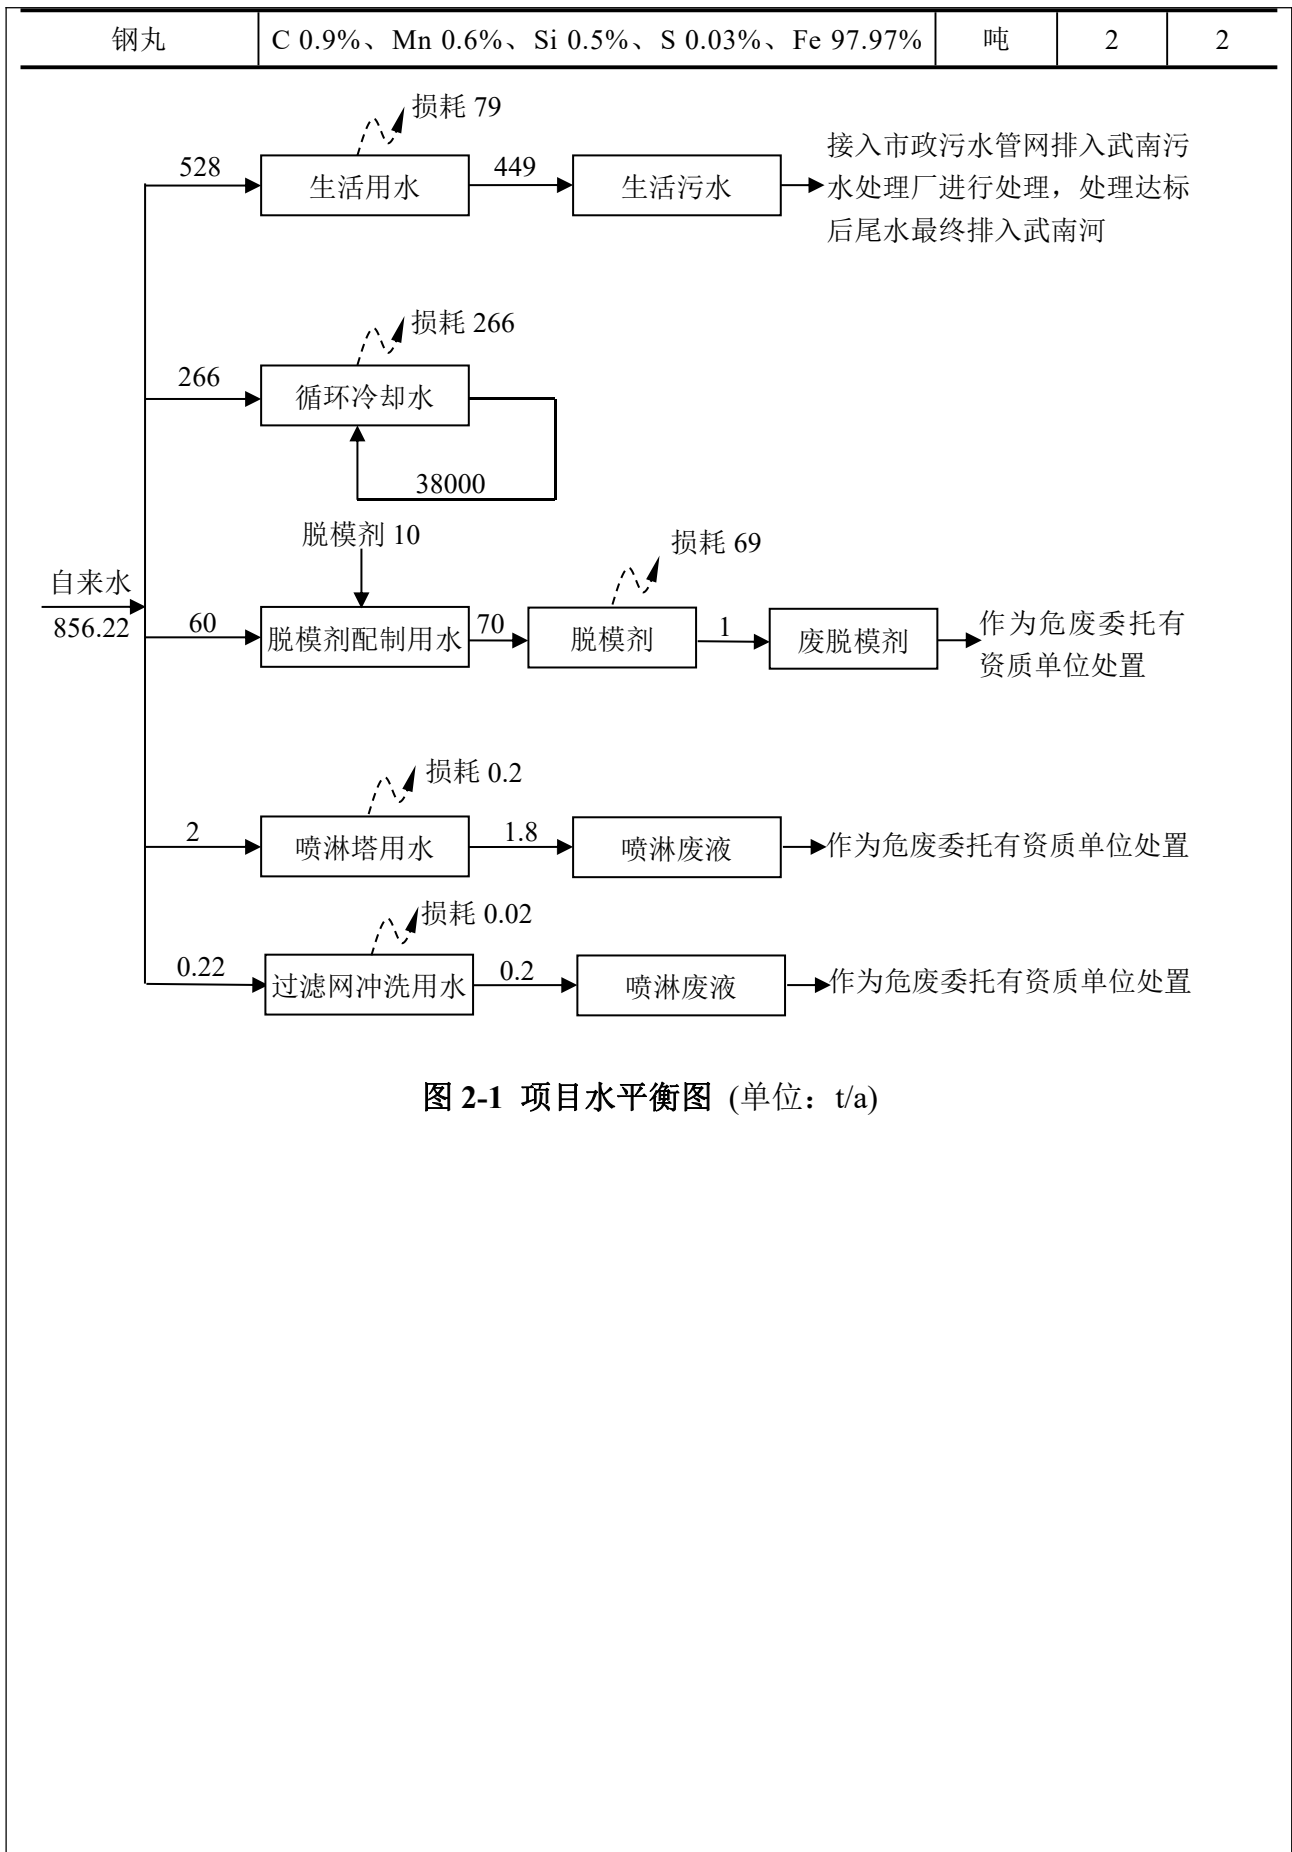

5、生产工艺

本项目产品主要为锌合金压铸（汽车零配件）、铝合金压铸（电器零配件），两种产品的生产工艺一致。具体工艺流程如下：

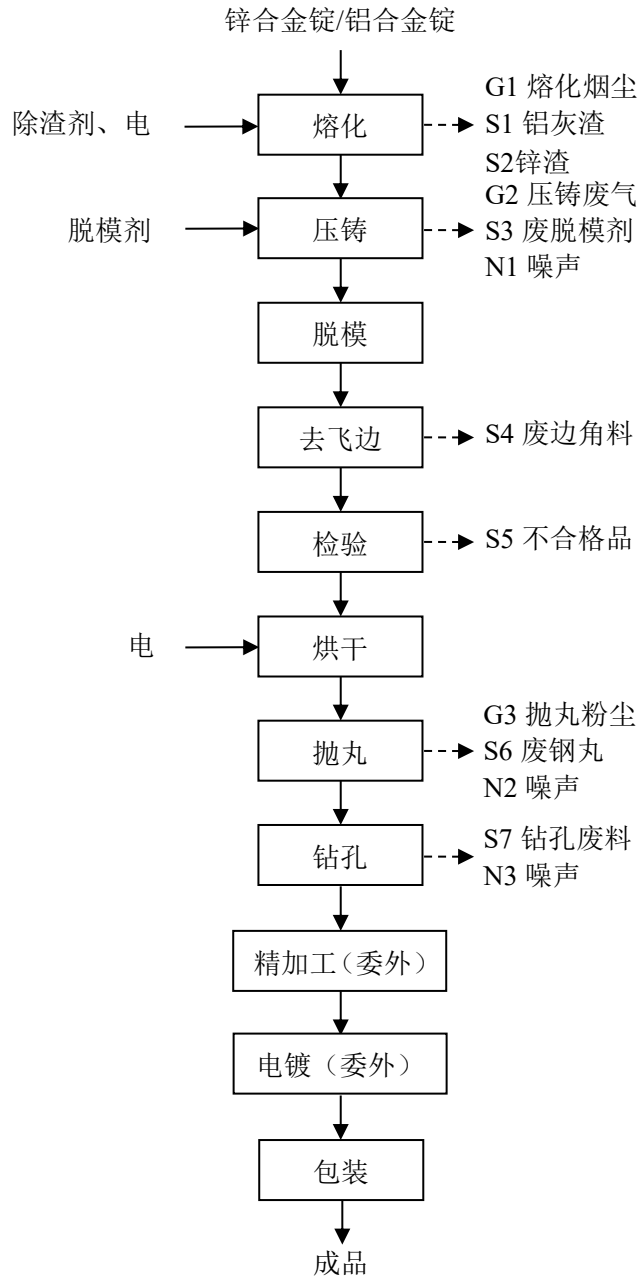


图 2-2 锌合金压铸（汽车零配件）、铝合金压铸（电器零配件）生产工艺流程图

工艺流程简述：

熔化：将外购的锌合金锭、铝合金锭分别加入到熔化炉内，使锌锭、铝锭熔化成锌液、铝液。熔化过程中加入除渣剂去除锌合金、铝合金中的杂质，人工对熔化的锌液、铝液表面漂浮的废渣进行撇渣。熔化炉采用电加热，锌合金锭熔化温度为420℃，铝合金锭熔化温

度为720°C。此工序产生熔化烟尘（G1）、铝灰渣（S1）、锌渣（S2）。

压铸：压铸是使液体金属在压力作用下充填型腔以形成铸件，项目锌合金压铸采用热室压铸工艺、铝合金压铸采用冷室压铸工艺。热室压铸工艺过程为：撇渣后的锌液通过压室上的进料口自动流入压室，压射冲头向下运动，推动锌液通过鹅颈管进入型腔，使锌液在压力作用下凝固；冷室压铸工艺过程为：利用机械手将撇渣后的铝液浇入压室内，然后压射冲头前进将铝液压入型腔，使铝液在压力作用下凝固。压铸前用压铸机自带的喷涂机对模具腔喷涂脱模剂（脱模剂与水按1：6配制），脱模剂起到润滑作用，防止工件与模具粘结在一起。压铸机运行过程中需用水进行间接冷却，冷却水循环使用，不外排。此工序产生压铸废气（G2）、废脱模剂（S3）和设备运行噪声（N1）。

脱模：人工将工件从模具中分离出来。

去飞边：工件取出后，由人工敲去边缘多余的部分，此工序产生废边角料（S4）。

检验：人工对工件进行检验，以剔除不合格品（S5）。

烘干：在梅雨季节或天气潮湿的情况下，工件表面会有水分，需用烘箱对工件进行烘干，以去除其表面水分。烘箱采用电加热，烘干温度为60-80°C。

抛丸：用抛丸机对工件进行抛丸处理，以去除工件表面的细小毛刺等杂质，提高铸件外观质量。此工序产生抛丸粉尘（G3）、废钢丸（S6）和设备运行噪声（N2）。

钻孔：抛丸后的工件用钻床在指定位置进行打孔，此工序产生钻孔废料（S7）和设备运行噪声（N3）。

精加工：根据工艺要求，采用车床、铣床、磨床等机加工设备对工件进行外形加工，此工序委外加工，不在本厂区内进行。

电镀：精加工后的工件进行电镀处理，此工序委外加工，不在本厂区内进行。

包装：外协电镀回来的工件经包装后入库，待发至客户处。

6、项目变动情况

常州市丰盈金属制品有限公司“年产4000吨锌合金压铸（汽车零配件）、铝合金压铸（电器零配件）项目”在实际实施过程中，与环评及审批内容对比，实际建成后未发生变动情况。

表三、环境保护设施

主要污染源、污染物处理和排放

1、废水

本验收项目废水主要为生活污水，经市政污水管网接入武南污水处理厂进行处理。具体废水排放及治理措施见表 3-1。

表 3-1 废水排放及治理措施一览表

废水类别	污染物种类	治理设施及排放去向	
		环评/批复	实际建设
生活污水	化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、pH 值	经市政污水管网接入武南污水处理厂进行处理	与环评一致

2、废气

本验收项目废气主要为熔化烟尘、压铸废气和抛丸粉尘，其中熔化烟尘、压铸废气经耐高温过滤网+水喷淋+光解催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过一根 15 米高排气筒(1#)排放；抛丸粉尘经抛丸机自带的脉冲袋式除尘装置处理后在车间内无组织排放。具体废气排放及治理措施见表 3-2。

表 3-2 废气排放及治理措施一览表

排放源		废气名称	污染物种类	治理设施及排放去向	
				环评/批复	实际建设
有组织废气	1#	熔化烟尘	颗粒物	经耐高温过滤网+水喷淋+光解催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过一根 15 米高排气筒（1#）排放	与环评一致
		压铸废气	非甲烷总烃		
无组织废气		抛丸粉尘	颗粒物	经抛丸机自带的脉冲袋式除尘装置处理后在车间内无组织排放	与环评一致
		未捕集废气	非甲烷总烃、颗粒物	通过加强车间通风予以缓解	与环评一致

3、噪声

本验收项目噪声源主要为机械设备运行时产生的噪声，针对噪声排放情况企业采取了以下治理措施：①优先选用低噪声设备，并合理布局，充分利用建筑物隔声、降噪；②噪声设备安装基础采用减振措施；③加强生产管理，确保各设备均保持良好的运行状态，防止突发噪声。具体排放及治理措施见表 3-3。

表 3-3 噪声排放及治理措施一览表

所在位置	噪声源名称	数量(台/套)	产生源强dB(A)	防治措施	
				环评/批复	实际建设
车间一	压铸机	7	88	合理布局+设备减震+厂房隔声	①优先选用低噪声设备,并合理布局,充分利用建筑物隔声、降噪;②噪声设备安装基础采用减振措施;③加强生产管理,确保各设备均保持良好的运行状态,防止突发噪声。
车间二	抛丸机	2	85		
/	空压机	2	93		
	循环冷却水塔	2	83		
	风机	3	88		

4、固体废物

(1) 固体废物产生及处理措施

本验收项目生产过程中主要产生一般固废、危险废物和生活垃圾。

①一般固废

锌渣：本项目锌锭在熔化过程中会产生锌渣，产生量约 10t/a，收集后暂存于一般固废库，外售综合利用。

废钢丸：本项目在抛丸过程中会产生废钢丸，产生量约 0.8t/a，收集后暂存于一般固废库，外售综合利用。

钻孔废料：本项目在钻孔过程中会产生钻孔废料，产生量约 3.9t/a，收集后暂存于一般固废库，外售综合利用。

抛丸集尘灰：本项目抛丸粉尘经脉冲袋式除尘装置处理后会产生产抛丸集尘灰，产生量约 2.89t/a，收集后暂存于一般固废库，外售综合利用。

废边角料、不合格品：本项目在去飞边过程中会产生废边角料，在检验过程中会产生不合格品，产生量合计约 120t/a，收集后作为回炉料重新熔化。

②危险废物

铝灰渣：本项目铝锭在熔化过程中会产生铝灰渣，产生量约 35t/a，收集后委托山西省太原固体废物处置中心（有限公司）处置。

废脱模剂：本项目压铸过程中脱模剂水溶液挥发产生烟气，会有少量滴漏在压铸机下方的收集槽内，因此会产生废脱模剂，产生量约 1t/a，收集后委托江苏盈天化学有限公司处置。

废包装桶：本项目废包装桶主要为脱模剂、润滑油的包装，产生量约 0.56t/a，收集后委托江苏盈天化学有限公司处置。

喷淋废液：本项目更换喷淋液会产生喷淋废液，耐高温过滤网冲洗过程中也会产生喷淋废液，产生量合计约 2t/a，收集后委托江苏盈天化学有限公司处置。

废活性炭：本项目有机废气经活性炭吸附装置处理后会产生废活性炭，产生量约 3.12t/a，收集后委托江苏盈天化学有限公司处置。

沉淀渣：本项目喷淋液沉淀过程中会产生沉淀渣，耐高温过滤网冲洗过程中也会产生沉淀渣，产生量合计约 2.187t/a，收集后暂存于危废库，委托有资质单位处置。

废油：本项目机械设备在维修保养过程中会产生废油，产生量约 0.75t/a，收集后暂存于危废库，委托有资质单位处置。

废灯管：本项目光催化氧化装置内置的灯管需定期进行更换，一般一年更换一次，废灯管产生量约 0.02t/a，收集后暂存于危废库，委托有资质单位处置。

含油废手套/抹布：本项目工人进行清洁生产和个人防护过程中会产生含油废手套/抹布，产生量约 0.05t/a，混入生活垃圾由环卫部门清运处置。

③生活垃圾

本项目员工日常生活会产生生活垃圾约 3.3t/a，由环卫部门定期清运。

本验收项目固废排放及治理措施见表 3-4。

表 3-4 固废产生及处理情况一览表

序号	类别	名称	产生工序	废物代码	环评产生量 t/a	实际产生量 t/a	防治措施	
							环评/批复	实际建设
1	一般固废	锌渣	熔化	900-999-99	10	10	外售综合利用	与环评一致
2		废钢丸	抛丸	900-999-99	0.8	0.8		
3		钻孔废料	钻孔	900-999-99	3.9	3.9		
4		抛丸集尘灰	废气处理	900-999-66	2.89	2.89		
5		废边角料	去飞边	900-999-99	120	120	作为回炉料重新熔化	
6		不合格品	检验	900-999-99				
7	危险废物	铝灰渣	熔化	HW48 321-026-48	35	35	委托有资质单位处置	委托山西省太原固体废物处置中心（有限公司）处置
8		废脱模剂	压铸	HW09 900-007-09	1	1		委托江苏盈天化学有限公司处置
9		废包装桶	原料使用	HW49 900-041-49	0.56	0.56		
10		喷淋废液	废气处理	HW09 900-007-09	2	2		
11		废活性炭	废气处理	HW49 900-039-49	3.12	3.12		

12		沉淀渣	废气处理	HW08 900-210-08	2.187	2.187		暂存危废库
13		废油	设备维修保养	HW08 900-249-08	0.75	0.75		
14		废灯管	废气处理	HW29 900-023-29	0.02	0.02		
15		含油废手套/抹布	个人防护	HW49 900-041-49	0.05	0.05	环卫部门处理	与环评一致
16	/	生活垃圾	员工生活	/	3.3	3.3		

注：①一般固废代码执行《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）；

②根据沉淀渣性质及《国家危险废物名录》（2021版），沉淀渣调整类别为危险废物，代码为HW08 900-210-08。

（2）固废暂存场所建设情况

①一般固废

经现场勘查，企业已在厂区建设一座一般固废暂存间，面积约50m²，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。

②危险废物

经现场勘查，企业已在厂区建设一座危废库，面积约30m²，满足现有危险废物的贮存能力。厂区已按环保要求张贴危险废物标志牌，仓库密闭建设，符合《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，地面采用水泥浇筑，并铺设环氧地坪，已进行防腐、防渗处理，设有导流沟、收集槽，满足“六防”（防雨、防晒、防扬散、防渗、防漏、防腐蚀）要求。危废库内设有防爆灯，危险废物分类贮存，不混放，贮存容器或包装上均粘贴小标签；库房大门上锁防盗，在门上设有观察窗，并在库内和库外分别设有监控。

（3）危险废物处置情况

企业铝灰渣收集后委托山西省太原固体废物处置中心（有限公司）处置，废脱模剂、废包装桶、喷淋废液、废活性炭收集后委托江苏盈天化学有限公司处置，均已签订危废处置合同；沉淀渣、废油、废灯管收集后暂存于危废库，待存储到一定量时，与有资质单位签订危险废物处置合同，并严格遵守转移联单管理制度。

5、其他环保设施

表 3-5 其他环保设施调查情况一览表

调查内容	执行情况
环境风险防范措施	①企业已在生产车间配备灭火器等消防器材； ②企业已建立巡查制度，专人负责废气处理设施的日常维护保养和检查，确保其正常运行。
在线监测装置	环评/批复未作要求。
污染物排放口规范化工程	本项目规范化设置雨水排放口 1 个、污水接管口 1 个、废气排放口 1 个，已规范采样口，并按环保要求张贴标志牌。
“以新带老”措施	环评/批复未作要求。
环保设施投资情况	本次验收项目实际总投资 1000 万元，其中环保投 33 万元，占总投资额的 3.3%。
“三同时”落实情况	项目工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时竣工、同时投入使用，能较好地履行环境保护“三同时”执行制度。

表四、环评主要结论及审批部门审批决定

1、建设项目环境影响报告表主要结论	
表 4-1 环境影响报告表结论摘录	
类别	结论摘录
环境保护措施	<p>本项目无生产废水产生，主要产生生活污水，排放量为 449t/a。本项目厂区内部已落实“雨污分流”，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网，生活污水接入市政污水管网后排入武南污水处理厂进行处理，处理达标后尾水最终排入武南河，因此对周围环境无直接影响。</p>
	<p>①有组织废气 熔化烟尘、压铸废气：建设单位在熔化炉、压铸机上方各设置集气装置，废气经收集后排至耐高温过滤网+水喷淋+光解催化氧化+活性炭吸附装置处理达标后由一根 15m 高排气筒（1#）排放。经过处理后，尾气中颗粒物排放浓度可达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表 1 中的标准要求、非甲烷总烃排放浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准要求，对周围环境影响较小。</p> <p>②无组织废气 本项目抛丸粉尘经脉冲袋式除尘装置处理后在车间内无组织排放，未捕集的 10%熔化烟尘、压铸废气在车间内无组织排放，通过加强车间通风予以缓解。</p> <p>经计算，本项目无组织排放的废气无超标点，因此，本项目不设大气环境防护距离。</p> <p>本项目卫生防护距离为车间一外扩 100m、车间二外扩 50m 形成的包络区域，该范围内无居民、学校等环境敏感保护目标，可满足卫生防护距离设置要求，将来在该卫生防护距离范围也不得新建居民、学校、医院等属于环境保护目标的项目。</p>
	<p>噪声 经监测，项目四周厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准。</p>
	<p>固废 建设项目产生的生活垃圾由环卫部门收集后统一处理。一般固体废物不直接排向外环境，废边角料、不合格品收集后作为回炉料重新熔化，锌渣、废钢丸、钻孔废料、抛丸集尘灰、沉淀渣均收集后暂存于一般固废库，外售利用；危险固废（铝灰渣、废脱模剂、废包装桶、喷淋废液、废灯管、废活性炭、废油、含油废手套/抹布）除含油废手套/抹布外均暂存于危废库，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，本项目在车间二北侧建设 30m² 的危废库，贮存能力能够满足要求。危险废物分类贮存，不混放；存放场所地面采用水泥浇筑，四周围墙，地面并做防腐处理，明确有防渗、防漏措施，以及危险废物堆放方式、警示标识等方面内容，危险废物贮存场所（设施）对周围环境基本不产生污染。</p> <p>因此，本项目产生的固体废物对周围环境无直接影响。</p>
总结论	<p>综上所述，建设项目符合国家、地方法规、产业政策和用地要求，选址合理。项目建设过程中应切实有效地落实好本评价提出的各项环保治理措施，严格管理，防止污染物事故排放，确保运营过程中产生的污染物经处理后达标排放，从环保角度分析，项目建设是可行的。</p>
建议	<p>①项目基础资料均由建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位若未来如需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行调整，则应按要求向当地环保部门进行申报，并按污染物控制目标采取相应的污染治理措施。</p> <p>②在项目建设同时，应确保环保设施的建设，落实污染治理方案和建设资金，做到“专款专用”。</p> <p>③项目建设应严格执行“三同时”制度，各类污染物的排放应执行本次环评中规定的标</p>

准。

④建立环保管理制度,管理人员及其员工应树立保护环境的思想,杜绝污染事故的发生。

2、审批部门审批决定

根据现场勘查,项目实际建设情况与环评批复要求对照一览表 4-2。

表 4-2 环评批复要求与实际情况对照一览表

类别	环评批复	验收现状
建设内容 (地点、规模、性质等)	根据《报告表》的评价结论,在落实《报告表》中提出的各项污染防治措施的前提下,同意你单位按照《报告表》所述内容进行项目建设。	常州市丰盈金属制品有限公司位于常州市武进区礼嘉镇建东村建东路 10 号,目前已建成年产 500 吨锌合金压铸(汽车零配件)、3500 吨铝合金压铸(电器零配件)的生产能力。
废水防治 设施与措施	按照“雨污分流、清污分流”原则建设厂内给排水系统。本项目冷却水循环使用,不外排;生活污水接入污水管网至武南污水处理厂集中处理。	本项目厂区内已落实“雨污分流”,生活污水经市政污水管网接入武南污水处理厂进行处理。经监测,废水中各污染因子均达标回用及排放。
废气防治 设施与措施	进一步优化废气处理方案,确保各类工艺废气处理效率达到《报告表》提出的要求。废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB32/3728-2020)和《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中有关标准。	本项目熔化烟尘、压铸废气经耐高温过滤网+水喷淋+光解催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过一根 15 米高排气筒(1#)排放;抛丸粉尘经抛丸机自带的脉冲袋式除尘装置处理后在车间内无组织排放。经监测,废气中各污染因子均达标排放。
噪声防治 设施与措施	选用低噪声设备,对高噪声设备须采取有效减振、隔声等降噪措施并合理布局。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准。	本项目采取以下治理措施:①优先选用低噪声设备,并合理布局,充分利用建筑物隔声、降噪;②噪声设备安装基础采用减振措施;③加强生产管理,确保各设备均保持良好的运行状态,防止突发噪声。经监测,厂界噪声均达标排放。
固废防治 设施与措施	严格按照有关规定,分类处理、处置固体废物,做到资源化、减量化、无害化。危险废物须委托有资质单位安全处置。危险废物暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求设置,防止造成二次污染。	本项目锌渣、废钢丸、钻孔废料、抛丸集尘灰收集后暂存于一般固废库,外售综合利用,废边角料、不合格品收集后作为回炉料重新熔化;铝灰渣收集后委托山西省太原固体废物处置中心(有限公司)处置,废脱模剂、废包装桶、喷淋废液、废活性炭收集后委托江苏盈天化学有限公司处置,沉淀渣、废油、废灯管收集后暂存于危废库,委托有资质单位处置;含油废手套/抹布混入生活垃圾由环卫部门定期清运。所有固体废物均得到有效处置,不外排。
排污口 规范化设置	按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关要求,规范化设置各类排污口和标志。	本项目规范化设置雨水排放口 1 个、污水接管口 1 个、废气排放口 1 个,已规范采样口,并按环保要求张贴标志牌。

总量 控制指标 t/a	水 污染物	生活污水量≤499， 化学需氧量≤0.18， 氨氮≤0.016， 总磷≤0.0022。	本项目废水、废气中各污染物及固体废物排放总量均符合环评及批复要求。
	大气 污染物	挥发性有机物≤0.18， 颗粒物≤0.243。	
	固体废物	全部综合利用或安全处置。	

表五、质量保证及质量控制

1、监测分析方法

本项目监测分析方法见表 5-1。

表 5-1 监测分析方法

类别	项目名称	分析方法	检出限
废水	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 (HJ 828-2017)	4mg/L
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 (GB/T 11901-1989)	4mg/L
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 (HJ 535-2009)	0.025mg/L
	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 (GB/T 11893-1989)	0.01mg/L
	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 (HJ 636-2012)	0.05mg/L
	pH 值	《水和废水监测分析方法》国家环保总局 2002 年(第四版) 便携式 pH 计法 3.1.6.2	/
有组织 废气	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱 法》(HJ 38-2017)	0.07mg/m ³ (以碳计)
	颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 (HJ 836-2017)	1.0mg/m ³
无组织 废气	非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气 相色谱法》(HJ 604-2017)	0.07mg/m ³ (以碳计)
	总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 (GB/T 15432-1995)	0.001mg/m ³
噪声	厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008)	/
	区域环境噪声	《声环境质量标准》 (GB 3096-2008)	/

2、监测仪器

本项目使用监测仪器见表 5-2。

表 5-2 验收使用监测仪器一览表

序号	仪器设备	型号	编号	检定/校准 情况
1	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	B-002	已检定
2	COD 标准消解器	HCA-102	B-035	已校准
3	岛津分析天平	AUY220	B-027	已检定
4	便携式 pH 计	PHB-4	A-027	已检定

5	全自动烟尘（气）测试仪	YQ3000-C	A-010、A-044	已检定
6	全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	A-005、A-006、A-007、 A-008、A-009	已检定
7	电子天平	QUINTIX125D-1CN	B-071	已检定
8	气相色谱仪	GC-2014C	B-046、B-072	已检定
9	多功能声级计	AWA5688	A-016	已检定
10	声校准器	AWA6222A	A-037	已检定
11	便携式综合气象观测仪	FYF-1	A-050	已检定

3、人员资质

本项目现场采样及实验室分析人员均经过考核并持有上岗证。

4、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）的要求进行。采样过程中采集一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，并对质控数据分析。质量控制情况见表 5-3。

表 5-3 质量控制情况表

污染物	样品数	平行样			加标样			质控样	
		平行样（个）	检查率（%）	合格率（%）	加标样（个）	检查率（%）	合格率（%）	质控样（个）	合格率（%）
化学需氧量	8	2	25.0	100	/	/	/	2	100
悬浮物	8	/	/	/	/	/	/	/	/
氨氮	8	1	12.5	100	1	12.5	100	/	/
总磷	12	2	16.7	100	2	16.7	100	/	/
总氮	8	1	12.5	100	1	12.5	100	/	/

5、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。

（2）被测排放物的浓度在仪器测试量程的有效范围内（即 30%~70%之间）。

（3）烟尘采样器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分析分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时保证其采样流量的准确。

（4）低浓度颗粒物测定时，在现场采样过程中增加了全程序空白检测，检测结果符合分析方法要求。

6、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计和声校准器均在检定的有效使用期内，声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB(A)。噪声校准记录见表5-4。

表 5-4 噪声校准情况表

监测日期	校准设备	编号	校准值	测量前	测量后	差值	校准情况
07月29日	声校准器 AWA6222A	A-037	94.0	93.8	94.0	0.2	合格
07月30日				93.8	94.0	0.2	合格

表六、验收监测内容

1、废水监测

本验收项目废水监测点位、项目和频次见表 6-1。

表 6-1 废水监测点位、项目和频次

废水名称	监测点位	监测项目	监测频次
生活污水	污水接管口	化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、pH 值	4 次/天，监测 2 天

2、废气监测

本验收项目废气监测点位、项目和频次见表 6-2。

表 6-2 废气监测点位、项目和频次

废气源	监测点位	监测项目	监测频次
有组织废气	1#排气筒进口、出口	非甲烷总烃、颗粒物	3 次/天，监测 2 天
无组织废气	厂界上风向 1 个点， 下风向 3 个点	非甲烷总烃、总悬浮颗粒物	3 次/天，监测 2 天
	厂区内、生产车间大门外 1m 处 1 个点	非甲烷总烃	3 次/天，监测 2 天
	在工业炉窑所在厂房生 产车间门、窗等排放口的 浓度最高点	总悬浮颗粒物	3 次/天，监测 2 天
备注	/		

3、噪声监测

本验收项目噪声监测点位、项目和频次见表 6-3。

表 6-3 噪声监测点位、项目和频次

类别	监测点位	监测项目	监测频次
厂界噪声	东、南、西、北厂界外 1m 处各设 1 个点	等效声级 Leq(A)	昼间测 1 次，监测 2 天
噪声源强	生产车间	等效声级 Leq(A)	昼间测 1 次，选测 1 天
敏感点	何四房、沈庄桥	等效声级 Leq(A)	昼间测 1 次，监测 2 天
备注	本项目夜间不生产		

表七、验收监测结果

生产工况

本验收项目验收监测期间生产运行工况见表7-1。

表 7-1 监测期间运行工况一览表

监测日期	产品名称	环评设计能力	实际生产能力	运行负荷%
07月29日	锌合金压铸（汽车零配件）	1.52 吨/天	1.28 吨/天	84.2
	铝合金压铸（电器零配件）	10.61 吨/天	9.58 吨/天	90.3
07月30日	锌合金压铸（汽车零配件）	1.52 吨/天	1.31 吨/天	86.2
	铝合金压铸（电器零配件）	10.61 吨/天	9.49 吨/天	89.4

验收监测期间，本项目主体工程及配套的三同时环保设施运行稳定，状态良好，实际生产能力满足环评设计能力要求，符合本次验收监测条件。

验收监测结果

1、废水

本验收项目验收监测期间废水监测结果与评价见表 7-2。

表 7-2 废水监测结果与评价一览表

监测 点位	日期	频次	检测结果					pH 值
			化学需氧量	悬浮物	氨氮	总磷	总氮	
污水 接管口	07月 29日	第一次	361	166	33.4	3.52	46.1	7.5
		第二次	348	148	32.1	3.80	41.3	7.2
		第三次	350	178	32.7	3.72	44.1	7.4
		第四次	354	156	33.1	3.40	43.1	7.2
		平均值 或范围	353	162	32.8	3.61	43.6	7.2~7.5
	07月 30日	第一次	365	116	31.1	2.78	38.8	7.3
		第二次	349	102	28.6	2.51	40.8	7.6
		第三次	363	122	30.1	2.90	36.8	7.5
		第四次	350	100	29.3	2.72	39.2	7.4
		平均值 或范围	357	110	29.8	2.73	38.9	7.3~7.6
浓度限值			500	400	45	8	70	6.5~9.5
评价结果			经检测，常州市丰盈金属制品有限公司污水接管口排放污水中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮的浓度与 pH 值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 B 级标准。					
备注			pH 值单位：无量纲					

2、废气

本验收项目验收监测期间有组织废气检测结果与评价见表 7-3，厂界无组织废气监测结果与评价见表 7-4。

表 7-3 有组织排放废气监测结果与评价一览表

1、测试工段信息									
工段名称	熔化、压铸工段				编号	1#			
治理设施名称	耐高温过滤网+水喷淋+光解催化氧化+活性炭吸附装置	排气筒高度 m	15		测点面积 m ²	进口：0.283 出口：0.283			
2、检测结果									
监测点位	测试项目	单位	排放 限值	检测结果					
				07月29日			07月30日		
				第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次
1#排气筒 进口	废气平均流量	m ³ /h	/	1.81×10 ⁴	1.83×10 ⁴	1.83×10 ⁴	1.81×10 ⁴	1.81×10 ⁴	1.82×10 ⁴
	非甲烷总烃排放浓度	mg/m ³	/	5.74	5.85	5.77	5.59	5.51	5.54
	非甲烷总烃排放速率	kg/h	/	0.104	0.107	0.106	0.101	0.100	0.101
	颗粒物排放浓度	mg/m ³	/	27.2	30.8	34.4	23.3	18.7	19.4
	颗粒物排放速率	kg/h	/	0.492	0.564	0.630	0.422	0.338	0.353
1#排气筒 出口	废气平均流量	m ³ /h	/	1.91×10 ⁴	1.91×10 ⁴	1.90×10 ⁴	1.92×10 ⁴	1.92×10 ⁴	1.93×10 ⁴
	非甲烷总烃排放浓度	mg/m ³	60	1.58	1.51	1.49	1.26	1.14	1.38
	非甲烷总烃排放速率	kg/h	3	0.030	0.029	0.028	0.024	0.022	0.027
	非甲烷总烃处理效率	%	/	71.2	72.9	73.6	76.2	78.0	73.3
	实测颗粒物排放浓度	mg/m ³	/	3.1	2.7	2.8	1.7	2.0	1.6

	折算后颗粒物排放浓度	mg/m ³	20	17.7	14.7	15.3	9.3	11.4	8.3
	颗粒物排放速率	kg/h	/	0.059	0.052	0.053	0.033	0.038	0.031
	颗粒物处理效率	%	/	88.0	90.8	91.6	92.2	88.8	91.2
评价结果			经检测，常州市丰盈金属制品有限公司 1#排气筒出口中非甲烷总烃的排放浓度与排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 1 中标准要求，颗粒物的排放浓度均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表 1 中标准要求。						
备注			本项目 1#排气筒废气处理系统实测风量略小于环评中设计风量，满足废气捕集要求。						

表 7-4 厂界无组织排放废气监测结果与评价一览表

采样地点及频次		检测结果				单位: mg/m ³	
		07月29日		07月30日			
		总悬浮颗粒物	非甲烷总烃	总悬浮颗粒物	非甲烷总烃		
上风向 1#点	第一次	0.096	0.61	0.105	0.58		
	第二次	0.115	0.58	0.114	0.55		
	第三次	0.106	0.58	0.133	0.59		
下风向 2#点	第一次	0.125	0.74	0.248	0.72		
	第二次	0.144	0.76	0.276	0.74		
	第三次	0.183	0.76	0.200	0.74		
下风向 3#点	第一次	0.212	0.75	0.143	0.75		
	第二次	0.240	0.68	0.152	0.72		
	第三次	0.269	0.74	0.162	0.74		
下风向 4#点	第一次	0.202	0.66	0.190	0.70		
	第二次	0.192	0.75	0.162	0.73		
	第三次	0.163	0.71	0.181	0.72		
周界外浓度最高值		0.269	0.76	0.276	0.75		
周界外浓度限值		0.5	4	0.5	4		
评价结果		经检测,常州市丰盈金属制品有限公司厂界无组织排放总悬浮颗粒物、非甲烷总烃的周界外浓度最高值均符合《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)表3中无组织排放限值。					
备注		/					

本项目验收监测期间,厂区内挥发性有机物无组织排放监测结果与评价见表 7-5。

表 7-5 厂区内挥发性有机物无组织排放监测结果与评价一览表

采样地点 及频次		检测结果										单位: mg/m ³	
		07月29日					07月30日						
		非甲烷总烃											
		单次浓度				小时 均值	单次浓度				小时 均值		
		1	2	3	4		1	2	3	4			
厂区内、 车间外 1m处	第一次	0.84	0.86	0.86	0.91	0.87	0.83	0.89	0.89	0.90	0.88		
	第二次	0.92	0.89	0.88	0.85	0.88	0.94	0.98	1.02	0.90	0.96		
	第三次	0.91	0.94	0.89	0.89	0.91	0.94	0.97	0.86	0.88	0.91		
浓度最高值		0.94				0.91	1.02				0.96		
浓度限值		20				6	20				6		

评价结果	经检测，常州市丰盈金属制品有限公司厂区内无组织排放的非甲烷总烃浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 2 中排放限值。
------	--

本项目验收监测期间，工业炉窑所在厂房生产车间外无组织排放总悬浮颗粒物监测结果与评价见表 7-6。

表 7-6 工业炉窑所在厂房生产车间外无组织排放总悬浮颗粒物监测结果与评价一览表

采样地点 及频次		检测结果		单位: mg/m ³
		07 月 29 日	07 月 30 日	
		总悬浮颗粒物		
工业炉窑所在厂房 生产车间门、窗等排 放口的浓度最高点	第一次	0.375		0.429
	第二次	0.413		0.562
	第三次	0.404		0.438
浓度最高值		0.413		0.562
浓度限值		5.0		5.0
评价结果		经检测，常州市丰盈金属制品有限公司工业炉窑所在厂房生产车间外无组织排放总悬浮颗粒物浓度均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表 3 中排放限值。		

监测时气象情况统计见表 7-7。

表 7-7 气象参数一览表

监测日期	监测频次	气温℃	气压 KPa	风向	风速 m/s	湿度%	天气
07 月 29 日	第一次	29.6	100.7	东风	2.7	50.9	晴
	第二次	30.9	100.7	东风	2.7	49.3	晴
	第三次	34.6	100.6	东风	2.6	49.6	晴
07 月 30 日	第一次	28.9	100.8	东风	2.9	51.1	晴
	第二次	31.7	100.8	东风	2.9	50.8	晴
	第三次	31.2	100.9	东风	2.9	50.1	晴

3、厂界噪声

验收监测期间噪声监测结果与评价见表 7-8。

表 7-8 噪声监测结果与评价一览表

监测时间	监测点位	昼间噪声 dB (A)	标准值 dB (A)
07 月 29 日	东厂界 1#测点	57.9	昼间≤60
	南厂界 2#测点	56.8	
	西厂界 3#测点	58.5	
	北厂界 4#测点	56.4	

	何四房	56	昼间≤60	
	沈庄桥	56		
07月30日	东厂界1#测点	56.2	昼间≤60	
	南厂界2#测点	57.4		
	西厂界3#测点	59.3		
	北厂界4#测点	56.7		
		何四房	57	昼间≤60
		沈庄桥	55	
评价结果	经检测，常州市丰盈金属制品有限公司东厂界1#测点、南厂界2#测点、西厂界3#测点、北厂界4#测点昼间环境噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类排放限值；敏感点何四房、沈庄桥昼间噪声均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中2类排放限值。			
备注	车间综合噪声：车间一 73.4dB（A）、车间二 77.5dB（A）。			

4、固废处置

本验收项目固废核查结果与评价见表 7-9。

表 7-9 固废核查结果与评价一览表

类别	名称	产生工序	废物代码	产生量 t/a	防治措施	
一般固废	锌渣	熔化	900-999-99	10	外售综合利用	
	废钢丸	抛丸	900-999-99	0.8		
	钻孔废料	钻孔	900-999-99	3.9		
	抛丸集尘灰	废气处理	900-999-66	2.89		
		废边角料	去飞边	900-999-99	120	作为回炉料重新熔化
	不合格品	检验	900-999-99			
危险废物	铝灰渣	熔化	HW48 321-026-48	35	委托山西省太原固体废物处置中心（有限公司）处置	
	废脱模剂	压铸	HW09 900-007-09	1	委托江苏盈天化学有限公司处置	
	废包装桶	原料使用	HW49 900-041-49	0.56		
	喷淋废液	废气处理	HW09 900-007-09	2		
	废活性炭	废气处理	HW49 900-039-49	3.12		
		沉淀渣	废气处理	HW08 900-210-08	2.187	暂存危废库
		废油	设备维修保养	HW08 900-249-08	0.75	
		废灯管	废气处理	HW29 900-023-29	0.02	
		含油废手套/抹布	个人防护	HW49 900-041-49	0.05	环卫部门处理

/	生活垃圾	员工生活	/	3.3	
评价结果		全部合理处置			

5、污染物排放总量核算

本验收项目总量核算结果见表 7-10。

表 7-10 主要污染物排放总量

污染物	总量控制指标 t/a		实际核算量 t/a	是否符合
生活污水	污水量	449	449	符合
	化学需氧量	0.18	0.159	
	悬浮物	0.13	0.061	
	氨氮	0.016	0.014	
	总磷	0.0022	0.0014	
	总氮	0.022	0.019	
有组织废气	非甲烷总烃	0.18	0.101	符合
	颗粒物	0.243	0.168	
固体废物	0		0	符合
评价结果	本验收项目废水中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮的排放量及污水总排放量均符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求；废气中非甲烷总烃、颗粒物的排放总量均符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求；固体废物处置率 100%，不外排，符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求。			
备注	经核实，1#排气筒废气年排放时间以 3800h 计。			

6、环保设施去除效率监测结果

本验收项目环保设施去除效率监测结果见表 7-11。

表 7-11 环保设施去除效率监测结果一览表

类别		污染源	治理设施	污染物去除效率评价
废水		生活污水	接管	不作评价
废气	有组织废气	1# 熔化烟尘、 压铸废气	耐高温过滤网+水喷淋+光解催化氧化+活性炭吸附装置	对非甲烷总烃的处理效率为 71.2%~78.0%，因进口浓度低于环评预测浓度，未达到环评设定去除率，但排放浓度及排放量均符合环评及批复要求；对颗粒物的处理效率为 88.0%~92.2%，基本符合环评设定去除率
	无组织废气		抛丸粉尘	脉冲除尘装置
			未捕集废气	车间通风
噪声		选用低噪声设备，合理布局、减震、厂房隔声等措施		不作评价
固体废物		全部合理处置		不作评价

表八、验收监测结论

江苏泰洁检测技术股份有限公司常州分公司对常州市丰盈金属制品有限公司“年产4000吨锌合金压铸（汽车零配件）、铝合金压铸（电器零配件）项目”进行了现场验收监测，具体各验收结果如下：

1、废水

企业厂区内已落实“雨污分流”原则。

本验收项目废水主要为生活污水，经市政污水管网接入武南污水处理厂进行处理。

验收监测期间，常州市丰盈金属制品有限公司污水接管口排放污水中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮的浓度与pH值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准。

2、废气

本验收项目废气主要为熔化烟尘、压铸废气和抛丸粉尘，其中熔化烟尘、压铸废气经耐高温过滤网+水喷淋+光解催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过一根15米高排气筒（1#）排放；抛丸粉尘经抛丸机自带的脉冲袋式除尘装置处理后在车间内无组织排放。

经检测，1#排气筒对应的废气治理设施（耐高温过滤网+水喷淋+光解催化氧化+活性炭吸附装置）对非甲烷总烃的处理效率为71.2%~78.0%，因进口浓度低于环评预测浓度，未达到环评设定去除率，但排放浓度及排放量均符合环评及批复要求；对颗粒物的处理效率为88.0%~92.2%，基本符合环评设定去除率。

验收监测期间，常州市丰盈金属制品有限公司1#排气筒出口中非甲烷总烃的排放浓度与排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1中标准要求，颗粒物的排放浓度均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表1中标准要求；厂界无组织排放总悬浮颗粒物、非甲烷总烃的周界外浓度最高值均符合《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3中无组织排放限值；厂区内无组织排放的非甲烷总烃浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表2中排放限值；工业炉窑所在厂房生产车间外无组织排放总悬浮颗粒物浓度均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表3中排放限值。

3、噪声

本验收项目噪声主要来自机械设备运转产生的机械噪声，企业采取了以下治理措施：

①优先选用低噪声设备，并合理布局，充分利用建筑物隔声、降噪；②噪声设备安装基础采用减振措施；③加强生产管理，确保各设备均保持良好的运行状态，防止突发噪声。

验收监测期间，常州市丰盈金属制品有限公司东厂界 1#测点、南厂界 2#测点、西厂界 3#测点、北厂界 4#测点昼间环境噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类排放限值；敏感点何四房、沈庄桥昼间噪声均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表 1 中 2 类排放限值。

4、固体废物

本验收项目产生的一般固废主要为锌渣、废钢丸、钻孔废料、抛丸集尘灰、废边角料、不合格品，其中锌渣、废钢丸、钻孔废料、抛丸集尘灰收集后暂存于一般固废库，外售综合利用，废边角料、不合格品收集后作为回炉料重新熔化；危险废物主要为铝灰渣、废脱模剂、废包装桶、喷淋废液、废活性炭、沉淀渣、废油、废灯管、含油废手套/抹布，其中铝灰渣收集后委托山西省太原固体废物处置中心（有限公司）处置，废脱模剂、废包装桶、喷淋废液、废活性炭收集后委托江苏盈天化学有限公司处置，沉淀渣、废油、废灯管收集后暂存于危废库，委托有资质单位处置；含油废手套/抹布混入生活垃圾由环卫部门定期清运。所有固体废物均得到有效处置，不外排。

经现场勘查，企业已在厂区建设一座一般固废暂存间，面积约 50m²，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。已在厂区建设一座危废库，面积约 30m²，满足现有危险废物的贮存能力。厂区已按环保要求张贴危险废物标志牌，仓库密闭建设，符合《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，地面采用水泥浇筑，并铺设环氧地坪，已进行防腐、防渗处理，设有导流沟、收集槽，满足“六防”（防雨、防晒、防扬散、防渗、防漏、防腐蚀）要求。危废库内设有防爆灯，危险废物分类贮存，不混放，贮存容器或包装上均粘贴小标签；库房大门上锁防盗，在门上设有观察窗，并在库内和库外分别设有监控。

5、总量控制

本验收项目废水中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮的排放量及污水总排放量均符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求；废气中非甲烷总烃、颗粒物的排放总量均符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求；固体废物处置率 100%，不外排，符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求。

6、排污口规范化设置

根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）规定，本项目规范化设置雨水排放口1个、污水接管口1个、废气排放口1个，已规范采样口，并按环保要求张贴标志牌。

7、卫生防护距离

本项目卫生防护距离为车间一外扩100m、车间二外扩50m形成的包络区域，经现场核实，目前该范围内无环境敏感目标，距离本项目厂界最近的敏感点为东北面约115m的沈庄桥。

总结论：经现场勘查，本项目建设地址未发生变化；项目产能满足环评设计能力要求；厂区平面布置、生产工艺、生产设备、原辅材料使用情况均未发生变化；环保“三同时”措施已经落实到位，污染防治措施符合环评及批复要求；经监测，污染物均达标排放，排放总量均符合环评批复要求。

综上，本验收项目满足建设项目竣工环境保护验收条件，现申请常州市丰盈金属制品有限公司“年产4000吨锌合金压铸（汽车零配件）、铝合金压铸（电器零配件）项目”验收。

建议

- 1、加强危废管理，规范处置。
- 2、定期对废气设施进行检查、维护，确保废气处理设施的正常运行和污染物稳定达标排放。

注释

本验收监测报告附以下附图及附件：

一、附图

- 1、项目地理位置图
- 2、项目平面布置及监测点位图
- 3、项目周边环境状况图

二、附件

- 1、委托书
- 2、环评批复
- 3、营业执照
- 4、不动产权证
- 5、排水许可证
- 6、生产设备清单
- 7、验收期间工况及污染物产生情况
- 8、危废处置合同
- 9、危废暂存承诺
- 10、一般固废与生活垃圾处置情况说明
- 11、建设项目竣工环境保护验收监测方案
- 12、排污许可证
- 13、验收现场照片

建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

填表单位（盖章）：江苏泰洁检测技术股份有限公司常州分公司

填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建设项目	项目名称	年产 4000 吨锌合金压铸（汽车零部件）、铝合金压铸（电器零配件）项目			项目代码	2018-320412-32-03-543786		建设地址	常州市武进区礼嘉镇建东村建东路 10 号			
	行业类别	C3392 有色金属铸造			建设性质	新建 (√)		改扩建	技改	迁建		
	设计生产能力	年产 500 吨锌合金压铸（汽车零部件）、3500 吨铝合金压铸（电器零配件）			实际生产能力	年产 500 吨锌合金压铸（汽车零部件）、3500 吨铝合金压铸（电器零配件）		环评单位	常州嘉骏环保服务有限公司			
	环评文件审批机关	常州市生态环境局			审批文号	常武环审[2021]194 号		环评文件类型	报告表			
	开工日期	2021 年 04 月			竣工日期	2021 年 07 月		排污许可证申领时间	2020 年 09 月 28 日			
	环保设施设计单位	常州市胜源环保设备厂			环保设施施工单位	常州市胜源环保设备厂		本工程排污许可证编号	9132041269258099X5001U			
	验收单位	江苏泰洁检测技术股份有限公司常州分公司			环保设施监测单位	江苏泰洁检测技术股份有限公司常州分公司		验收监测时工况	>75%			
	投资总概算（万元）	1000			环保投资总概算（万元）	33		所占比例（%）	3.3			
	实际总投资（万元）	1000			实际环保投资（万元）	33		所占比例（%）	3.3			
	废水治理（万元）	/	废气治理（万元）	25	噪声治理（万元）	1	固废治理（万元）	5	绿化及生态（万元）	/	其他（万元）	2
	新增废水处理设施能力	/			新增废气处理设施能力	20000m ³ /h		年平均工作时间	3960 小时			

运营单位		常州市丰盈金属制品有限公司			运营单位社会统一信用代码 (或组织机构代码)			9132041269258099X5		验收监测时间		2021年07月29-30日		
污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填)	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新代老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)	
	废水	—	—	—	449	—	449	449	—	449	449	—	+449	
	化学需氧量	—	355	500	0.159	—	0.159	0.18	—	0.159	0.18	—	+0.159	
	氨氮	—	31.3	45	0.014	—	0.014	0.016	—	0.014	0.016	—	+0.014	
	总磷	—	3.17	8	0.0014	—	0.0014	0.0022	—	0.0014	0.0022	—	+0.0014	
	废气	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	颗粒物	—	—	20	1.773	1.605	0.168	0.243	—	0.168	0.243	—	+0.168	
	非甲烷总烃	—	—	60	0.392	0.291	0.101	0.18	—	0.101	0.18	—	+0.101	
	工业固体废物	一般固废	—	—	—	137.59	137.59	0	0	—	0	0	—	0
		危险废物	—	—	—	44.687	44.687	0	0	—	0	0	—	0
与项目有关的其他特征污染物	悬浮物	—	136	400	0.061	—	0.061	0.13	—	0.061	0.13	—	+0.061	
	总氮	—	41.25	70	0.019	—	0.019	0.022	—	0.019	0.022	—	+0.019	

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

常州市丰盈金属制品有限公司年产 4000 吨锌合金压铸（汽车零配件）、铝合金压铸（电器零配件）项目竣工环境保护验收意见

2021 年 08 月 07 日，常州市丰盈金属制品有限公司组织召开“年产 4000 吨锌合金压铸（汽车零配件）、铝合金压铸（电器零配件）项目”竣工环境保护验收会议，根据《年产 4000 吨锌合金压铸（汽车零配件）、铝合金压铸（电器零配件）项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收小组由该项目建设单位、环评编制单位、环保工程建设单位、验收监测报告编制单位、并特邀 3 名专家组成。

验收小组现场踏勘了本项目建设情况，听取了建设单位关于项目建设和环保管理制度落实情况的介绍，验收监测报告编制单位对环保验收监测情况的汇报，一致确认本次验收项目不存在验收暂行办法中规定的几种不予验收的情形。验收专家经审核有关资料，确认验收监测报告资料较为翔实、内容较为完整、编制较为规范、结论较为合理。经认真研究讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

常州市丰盈金属制品有限公司成立于 2009 年 07 月 28 日，位于常州市武进区礼嘉镇建东村建东路 10 号，项目建成后形成年产 4000 吨锌合金压铸（汽车零配件）、铝合金压铸（电器零配件）的生产规模，具体为年产 500 吨锌合金压铸（汽车零配件）、3500 吨铝合金压铸（电器零配件）。

（二）建设过程及环保审批情况

常州市丰盈金属制品有限公司于 2021 年 01 月委托常州嘉骏环保服务有限公司编制《年产 4000 吨锌合金压铸（汽车零配件）、铝合金压铸（电器零配件）项目环境影响报告表》，并于 2021 年 04 月 19 日取得常州市生态环境局的批复（常武环审[2021]194 号）。

根据《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关文件要求，常州市丰盈金属制品有限公司已取得排污许可证（编号：9132041269258099X5001U）。

该项目目前形成年产 500 吨锌合金压铸（汽车零配件）、3500 吨铝合金压铸（电器零配件）的生产能力，未超出环评审批范围。

该项目自立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

该项目实际总投资 1000 万元，其中环保投资 33 万元，占总投资额的 3.3%。

（四）验收范围

本次验收内容为常州市丰盈金属制品有限公司“年产 4000 吨锌合金压铸（汽车零配件）、铝合金压铸（电器零配件）项目”的整体验收，即生产能力为年产 500 吨锌合金压铸（汽车零配件）、3500 吨铝合金压铸（电器零配件）。

二、工程变动情况

常州市丰盈金属制品有限公司“年产 4000 吨锌合金压铸（汽车零配件）、铝合金压铸（电器零配件）项目”在实际实施过程中，与环评及审批内容对比，实际建成后未发生变动情况。

三、环境保护设施建设情况及环境管理情况

（一）废水

企业厂区内已落实“雨污分流”原则。

本验收项目废水主要为生活污水，经市政污水管网接入武南污水处理厂进行处理。

（二）废气

本验收项目废气主要为熔化烟尘、压铸废气和抛丸粉尘，其中熔化烟尘、压铸废气经耐高温过滤网+水喷淋+光解催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过一根 15 米高排气筒（1#）排放；抛丸粉尘经抛丸机自带的脉冲袋式除尘装置处理后在车间内无组织排放。

（三）噪声

本验收项目噪声主要来自机械设备运转产生的机械噪声，企业采取了以下治理措施：①优先选用低噪声设备，并合理布局，充分利用建筑物隔声、降噪；②噪声设备安装基础采用减振措施；③加强生产管理，确保各设备均保持良好的运行状态，防止突发噪声。

（四）固体废物

本验收项目产生的一般固废主要为锌渣、废钢丸、钻孔废料、抛丸集尘灰、废边角料、不合格品，其中锌渣、废钢丸、钻孔废料、抛丸集尘灰收集后暂存于一般固废库，外售综合利用，废边角料、不合格品收集后作为回炉料重新熔化；危险废物主要为铝灰渣、废脱模剂、废包装桶、喷淋废液、废活性炭、沉淀渣、废油、废灯管、含油废手套

/抹布，其中铝灰渣收集后委托山西省太原固体废物处置中心（有限公司）处置，废脱模剂、废包装桶、喷淋废液、废活性炭收集后委托江苏盈天化学有限公司处置，沉淀渣、废油、废灯管收集后暂存于危废库，委托有资质单位处置；含油废手套/抹布混入生活垃圾由环卫部门定期清运。

经现场勘查，企业已在厂区建设一座一般固废暂存间，面积约 50m²，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。已在厂区建设一座危废库，面积约 30m²，满足现有危险废物的贮存能力。厂区已按环保要求张贴危险废物标志牌，仓库密闭建设，符合《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，地面采用水泥浇筑，并铺设环氧地坪，已进行防腐、防渗处理，设有导流沟、收集槽，满足“六防”（防雨、防晒、防扬散、防渗、防漏、防腐蚀）要求。危废库内设有防爆灯，危险废物分类贮存，不混放，贮存容器或包装上均粘贴小标签；库房大门上锁防盗，在门上设有观察窗，并在库内和库外分别设有监控。

（五）其他环境保护设施

1、环境风险防范措施

①企业已在生产车间配备灭火器等消防器材；

②企业已建立巡查制度，专人负责废气处理设施的日常维护保养和检查，确保其正常运行。

2、排污口规范化设置

根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）规定，本项目规范化设置雨水排放口 1 个、污水接管口 1 个、废气排放口 1 个，已规范采样口，并按环保要求张贴标志牌。

3、卫生防护距离

本项目卫生防护距离为车间一外扩 100m、车间二外扩 50m 形成的包络区域，经现场核实，目前该范围内无环境敏感目标，距离本项目厂界最近的敏感点为东北面约 115m 的沈庄桥。

（六）环境管理制度

公司落实建立了比较完善的环境管理体系、环境保护管理规章制度。公司在运行过程中，依据当前环境保护管理要求，分别制定了公司内部的环境管理制度。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水

验收监测期间，常州市丰盈金属制品有限公司污水接管口排放污水中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮的浓度与 pH 值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 B 级标准。

2、废气

验收监测期间，常州市丰盈金属制品有限公司 1#排气筒出口中非甲烷总烃的排放浓度与排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 1 中标准要求，颗粒物的排放浓度均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表 1 中标准要求；厂界无组织排放总悬浮颗粒物、非甲烷总烃的周界外浓度最高值均符合《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 3 中无组织排放限值；厂区内无组织排放的非甲烷总烃浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 2 中排放限值；工业炉窑所在厂房生产车间外无组织排放总悬浮颗粒物浓度均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表 3 中排放限值。

3、噪声

验收监测期间，常州市丰盈金属制品有限公司东厂界 1#测点、南厂界 2#测点、西厂界 3#测点、北厂界 4#测点昼间环境噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类排放限值；敏感点何四房、沈庄桥昼间噪声均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表 1 中 2 类排放限值。

4、固体废物

所有固体废物均能得到有效处置，不外排。

5、污染物排放总量

本验收项目废水中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮的排放量及污水总排放量均符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求；废气中非甲烷总烃、颗粒物的排放总量均符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求；固体废物处置率 100%，不外排，符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求。

（二）环保设施去除效率

1、废水治理设施

本项目生活污水接入市政污水管网，处理效率不作评价。

2、废气治理设施

经检测，1#排气筒对应的废气治理设施（耐高温过滤网+水喷淋+光解催化氧化+活性炭吸附装置）对非甲烷总烃的处理效率为71.2%~78.0%，因进口浓度低于环评预测浓度，未达到环评设定去除率，但排放浓度及排放量均符合环评及批复要求；对颗粒物的处理效率为88.0%~92.2%，基本符合环评设定去除率。

五、工程建设对环境的影响

1、本项目生活污水接入市政污水管网，对周边地表水环境不构成直接影响。

2、本项目废气达标排放，对大气环境影响较小。

3、本项目各厂界噪声均达标排放，对周边噪声环境不构成超标影响。

4、本项目固体废物分类处置，不外排，对周边环境无直接影响；危废库铺设环氧地坪，已进行防腐、防渗处理，对地下水、土壤无直接影响。

六、验收结论

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，监测相关技术规范及环保法规，经验收小组踏勘现场、查阅验收材料的基础上，验收小组认为：

常州市丰盈金属制品有限公司“年产4000吨锌合金压铸（汽车零配件）、铝合金压铸（电器零配件）项目”建设内容符合环评要求，落实了环评批复的各项污染防治措施要求和卫生防护距离要求，监测数据表明废水、废气中污染物排放浓度达标，污染物排放总量达到审批要求；对照自主验收的要求，本次验收项目竣工环保验收合格。

七、后续要求

1、加强危废管理，规范处置。

2、定期对废气设施进行检查、维护，确保废气处理设施的正常运行和污染物稳定达标排放。

常州市丰盈金属制品有限公司

2021年08月07日
